

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ. НАБЕРЕЖНОЙ В С. АННА



Автор проекта - Никифорова Юлия Анатольевна

**Место проекта – Находкинский городской округ, с. Анна,
ул. Набережная**

Благополучатели – жители и гости муниципального образования

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ. НАБЕРЕЖНОЙ В С. АННА

- Ул. Набережная является центральной в с. Анна и на сегодняшний день нуждается в проведении благоустроительных работ.
- **Мероприятия по реализации проекта:**
благоустройство ул. Набережной (тротуар, дорога)
- **Ожидаемые результаты:**
Благоустройство ул. Набережной



Благоустройство ул. Набережной в с. Анна

- Стоимость проекта - 2 400 000 руб.
- Подрядная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Приминжиниринг»
- Дата подписания контракта 09.03.2023
- Срок выполнения работ (плановый) – 15.07.2023
- Срок выполнения работ (фактический) –



Благоустройство ул. Набережной в с. Анна

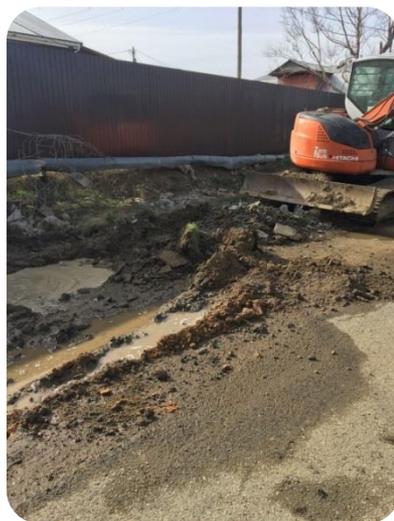


**ФОТО ТЕРРИТОРИИ
ДО НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**



Благоустройство ул. Набережной в с. Анна

Этап реализации проекта на 21.04.2023



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- 1. УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ И ЛИВНЕСТОЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.**



Благоустройство ул. НАБЕРЕЖНОЙ в с. Анна

Этап реализации проекта на 30.05.2023



Благоустройство ул. Набережной в с. Анна

Этап реализации проекта на 15.06.2023



Выполненные работы:

1. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
2. УСТАНОВКА ЛИВНЕСТОЧНЫХ ЛОТКОВ
3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ



Благоустройство ул. Набережной в с. Анна

Этап реализации проекта на 29.06.2023



Выполненные работы:

- 1. Устройство дренажного колодца**
- 2. Врезка ливнесточной канализации в существующий ливнесток**

