

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Проектного комитета**  
**Находкинского городского округа**

27 апреля 2024 года

12:00 ч.

Председатель – глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский

Присутствовали: 35 человека (Приложение №1).

---

**1. Награждение общественных наблюдателей Находкинского городского округа по итогам проделанной работы в 2023 году.**

---

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский

Список награждаемых общественных наблюдателей прилагается (Приложение № 2).

---

**2. Представление новых общественных наблюдателей Находкинского городского округа**

---

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа  
Л.А. Якименко

Список общественных наблюдателей отобранных региональной комиссией Приморского края в 2024 году прилагается (Приложение № 3).

---

**3. О результатах мониторинга выполненных работ, объектов реализуемых в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов по итогам выездов общественных наблюдателей за период с 30.03.2024 по 26.04.2024**

---

3.1 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей с 30.03.2024 г. по 26.04.2024 г. на объекты: капитальный ремонт крыши здания МАУК «Международный морской клуб»; капитальный ремонт библиотек № 4, 15; реконструкция трибун стадиона «Водник»; комплексное благоустройство видовая площадка № 3; комплексное благоустройство «Сквер в районе МЦК» 1 этап; капитальный ремонт, благоустройство территории, капитальный ремонт помещений и санузлов МБДОУ №33; капитальный ремонт ливневой канализации и асфальта-бетонного покрытия МБДОУ № 37; капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ СОШ № 14; капитальный ремонт, благоустройство территории, спортивная площадка МАОУ

СОШ № 22; благоустройство дворовых территорий по адресу: г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8; ул. Заводская, д.3; ул. Малиновского, д.17 ; ул. Мичурина, д. 18; ул. Нахимовская, д. 8А; ул. Находкинский пр-т, д. 30; ул. Находкинский пр-т, д. 80; ул. Пограничная, д.24; ул. Пограничная, д. 30; ул. Проспект Мира, д. 18; ул. Проспект Мира, д. 30Б; ул. Рыбацкая, д. 8; п. Врангель ул. Восточный пр-т, д. 9; ул. Железнодорожная, д. 2; ул. Первостроителей, д. 1; ул. Приморский пр-т, д. 6; п. Ливадия ул. Заречная, д. 3; ул. Луговая, д. 26; п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 5 (Приложение № 4).

3.2 Принять к сведению информацию от общественного наблюдателя Бондаренко А.В. об отсутствии паспорта объекта капитального ремонта наружной лестницы (входная группа) здания МАУК «Центр культуры» по адресу г. Находка, ул. Ленинская, 22.

3.3 Начальнику управления культуры администрации Находкинского городского округа (Ольшевская Т.В.) обеспечить наличие паспорта объекта на объекте: капитальный ремонт наружной лестницы (входная группа) здания МАУК «Центр культуры» по адресу г. Находка, ул. Ленинская, 22 **в срок до 15.05.2024 года.**

3.4 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить наличие паспортов объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) на объектах, реализуемых в 2024 году на территории Находкинского городского округа **в срок до 01.06.2024 года.**

---

#### **4. О заключении контрактов по объектам и мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и планов развития центров экономического роста, инициативного бюджетирования и программы благоустройства сельских территорий на 2024 год.**

---

4.1 Принять к сведению информацию о заключении контрактов по объектам и мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и планов развития центров экономического роста заместителя главы администрации Находкинского городского округа - начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Мухамадиевой Е.А.; начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Арапова О.В.

4.2 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа - начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.) обеспечить проведение закупочных процедур по объектам:

- обустройство армейской полосы препятствий по адресу ул. Заречная, 17, г. Находка, мкр. п. Ливадия, Приморский край, реализуемый в рамках инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет»;

- капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ СОШ № 11

**в срок до 20.05.2024 года.**

4.3 Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа (Арапов О.В.) обеспечить проведение закупочных процедур по объекту ремонт и обустройство спортивных залов борьбы (зал самбо и зал дзюдо, общей площадью 140 кв.м.) по адресу ул. 1-я Заводская, 2, мкр. п. Ливадия, г. Находка, реализуемый в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» **в срок до 20.05.2024 года.**

---

**5. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования и программы благоустройства сельских территорий на 26 апреля 2024 года.**

---

5.1 Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. по исполнению бюджета по состоянию на 26.04.2024 года (Приложение № 5).

5.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

---

**4. О выполнении поручений протокола № 3 заседания Проектного комитета Находкинского городского округа от 29.03.2024г.**

---

4.1 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о выполнении поручений протокола № 3 заседания Проектного комитета Находкинского городского округа от 29.03.2024г.

4.2 Отраслевым функциональным (территориальным) органам администрации Находкинского городского округа:

-обеспечить соблюдение сроков исполнения поручений протоколов заседания Проектного комитета;

- своевременно актуализировать информацию о результатах выполнения поручений протоколов заседания Проектного комитета в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (Журавлевой А.А.)

Нарушение порядка предоставления сведений, несвоевременное или неполное предоставление этих сведений, либо предоставление недостоверных сведения влечет персональную ответственность.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа

Л.А. Якименко

Секретарь

А.А. Журавлева

## СПИСОК

### участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

27.04.2024

12:00

1. **ЯКИМЕНКО**  
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
2. **ВАЛЕВИЧ**  
Вера Николаевна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
3. **МУХАМАДИЕВА**  
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;
4. **ПОДГОРНЫЙ**  
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
5. **АРАПОВ**  
Олег Васильевич - начальник управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
6. **БУРЛАКОВА**  
Ольга Николаевна - заместитель директора МКУ «ЦБМУК» Находкинского городского округа;
7. **ВОРОНИНА**  
Александра Анатольевна - начальник финансового управления администрации Находкинского городского округа;
8. **ЗУБКОВА**  
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
9. **КО**  
Владимир Теоевич - начальник департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации Находкинского городского округа;
10. **ЛЁЛИН**  
Игорь Валерьевич - директор МКУ "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений" Находкинского городского округа;

11. **МИНКЕВИЧ**  
**Ольга Сергеевна** - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа;
12. **ПЕТРОШЕНКО**  
**Кристина Алексеевна** - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
13. **РОЙ**  
**Константин Евгеньевич** - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
14. **РУДНИЦКАЯ**  
**Светлана Ивановна** - заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
15. **СИКИСОВ**  
**Евгений Петрович** - заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Управление капитального строительства»;
16. **УСТИНОВ**  
**Алексей Иванович** - директор МКУ «Управление капитального строительства»;
17. **УСТИНОВА**  
**Ольга Валентиновна** - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
18. **ФИРСЕНКОВ**  
**Виктор Алексеевич** - директор МКУ "Находка ДАГиЗ";
19. **ЖУРАВЛЕВА**  
**Альбина Андреевна** - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
20. **БЕЛОБОРОДОВА**  
**Юлия Валентиновна** - общественный наблюдатель;
21. **БОНДАРЕНКО**  
**Александр Валериевич** - общественный наблюдатель;
22. **ВАСИЛЬЕВА**  
**Глория Васильевна** - общественный наблюдатель;
23. **КАРАПЕТЯН**  
**Карен Камоевич** - общественный наблюдатель;
24. **ЛЕОНОВА**  
**Юлия Владимировна** - общественный наблюдатель;
25. **НАГИН**  
**Сергей Юрьевич** - общественный наблюдатель;

- |     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 26. | <b>ТЕН<br/>Маргарита<br/>Константиновна</b> | - общественный наблюдатель; |
| 27. | <b>ЧИГРИНСКАЯ<br/>Наталья Викторовна</b>    | - общественный наблюдатель; |
| 28. | <b>ЯШКИНА<br/>Анна Анатольевна</b>          | - общественный наблюдатель; |
| 29. | <b>ВАСИЛЬЕВ<br/>Станислав Сергеевич</b>     | общественный наблюдатель;   |
| 30. | <b>ГАВРИШ<br/>Владимир Анатольевич</b>      | общественный наблюдатель;   |
| 31. | <b>ГОЛОВЧЕНКО<br/>Валерия Александровна</b> | общественный наблюдатель;   |
| 32. | <b>МИТЕЛЕНКО<br/>Михаил Михайлович</b>      | общественный наблюдатель;   |
| 33. | <b>МОРДОВСКОЙ<br/>Денис Витальевич</b>      | общественный наблюдатель;   |
| 34. | <b>НАЗРУК<br/>Екатерина Андреевна</b>       | общественный наблюдатель;   |
| 35. | <b>ТРУНЬКИНА<br/>Татьяна Владимировна</b>   | общественный наблюдатель.   |

## **СПИСОК**

### **Награждаемых общественных наблюдателей Находкинского городского округа**

1. БЕЛОБОРОДОВА Юлия Валентиновна
2. БОНДАРЕНКО Александр Валериевич
3. ВАСИЛЬЕВА Глория Васильевна
4. КАРАПЕТЯН Карен Камоевич
5. ЛЕОНОВА Юлия Викторовна
6. НАГИН Сергей Юрьевич
7. РАКАУСКАС Максим Ромуальдасович
8. ТЕН Маргарита Константиновна
9. ЧИГРИНСКАЯ Наталья Викторовна
10. ЯШКИНА Анна Анатольевна

## **СПИСОК**

### **Общественных наблюдателей отобранных региональной комиссией Приморского края в 2024 году**


1. ВАСИЛЬЕВ Станислав Сергеевич
2. ГАВРИШ Владимир Анатольевич
3. ГОЛОВЧЕНКО Валерия Александровна
4. ГОРЩИК Вероника Александровна
5. МИТЕЛЕНКО Михаил Михайлович
6. МОРДОВСКОЙ Денис Витальевич
7. НАЗРУК Екатерина Андреевна
8. ТРУНЬКИНА Татьяна Владимировна



ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

---

НАХОДКА

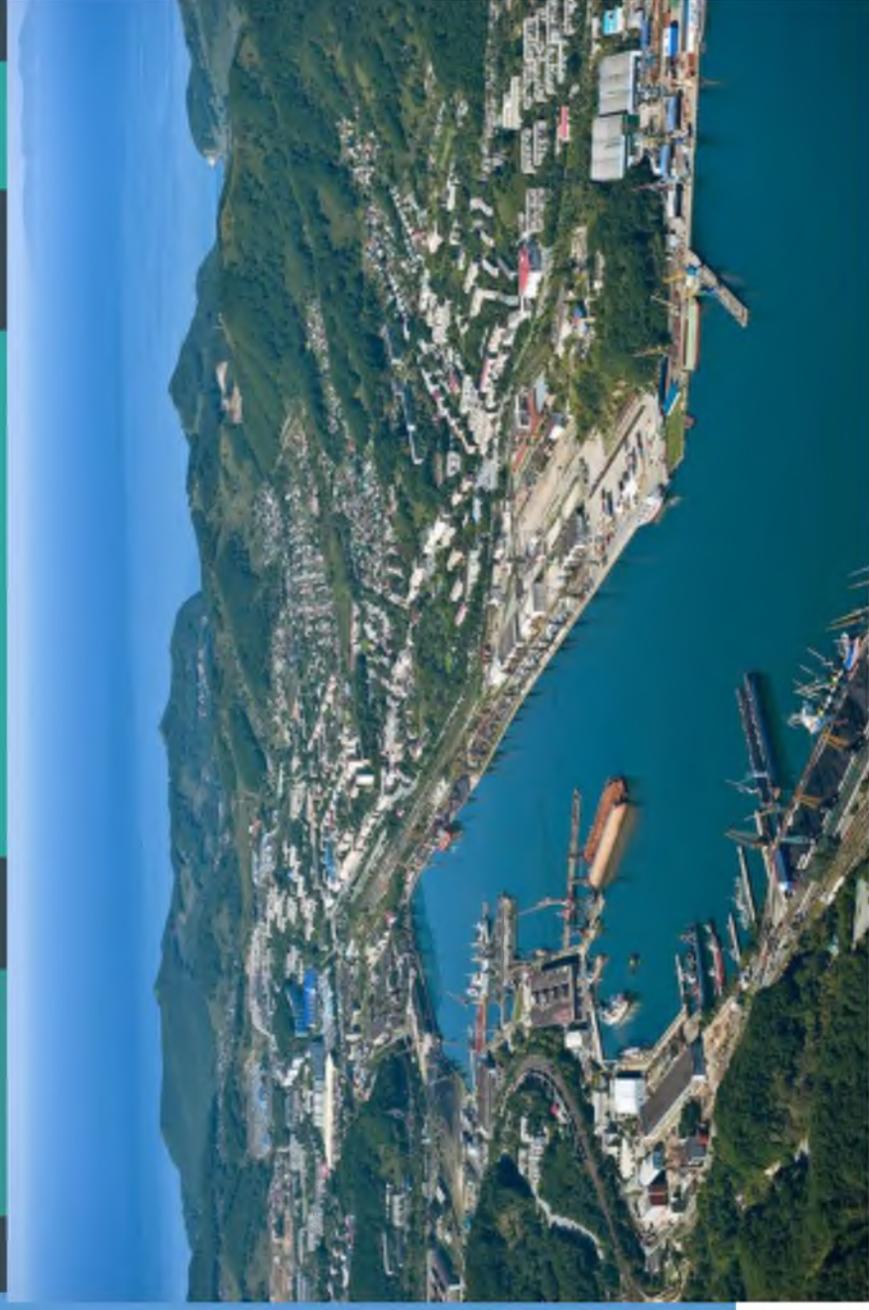



**РЕЗУЛЬТАТЫ  
мониторинга объектов  
по итогам выездов  
с 30.03.2024 года  
по 26.04.2024 года**

# Количество выездов на объекты в апреле – 31 выезд



Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству выездов на объекты в **апреле**:

1. Нагин С.Ю.– 25 выездов
2. Васильева Г.В. – 24 выезда
3. Белобородова Ю.В – 20 выезд
4. Чигринская Н.В. – 18 выездов
5. Леонова Ю.В. – 7 выездов

Находкинский ГО





**100% - выполнение работ по объектам АПРЕЛЬ 2024 г.**

## **Капитальный ремонт крыши здания МАУК "Международный морской клуб"**

**План социального развития центров экономического роста  
(Развитие культуры в ПК)**

г. Находка ул. Нахимовская д. 31

Дата выезда 11.04.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Васильева Глория Васильевна*

*Чигринская Наталья Викторовна*

*Ракаускас Максим Ромуальдасович*

*Бондаренко Александр Валерьевич*


### **Комментарии по объекту:**

- Произведена замена старых покрытий кровли на листы стали и металлочерепицу
- Произведена укладка пароизоляции крыши
- Пропитка огнебиозащитой деревянных конструкции крыши
- Оборудованы слуховых окна
- Произведена установка новой металлической лестницы подъема на кровлю
- Установлены новые подвесные желоба, оборудованы водостоки

На объекте в момент выезда находилось 5 рабочих.

Работы на объекте завершены

**Замечаний нет.**

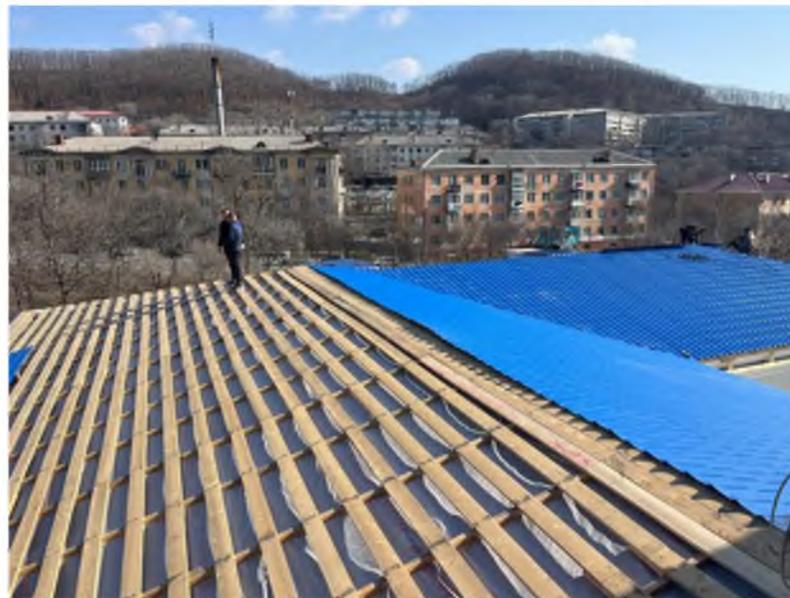

Фотоматериалы предоставлены подрядчиком



## Капитальный ремонт Библиотека № 4

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Горького, 14а  
Дата выезда 04.04.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна  
Васильева Глория Васильевна  
Нагин Сергей Юрьевич*

#### Комментарии по объекту:

- Стены и потолок подготовлены к покраске
- Произведена обшивка труб гипсокартонном
- Произведена заменена система канализации
- Установлен полотенцесушитель

На объекте в момент выезда находилось 4 рабочих.

Объем выполненных работ около 50 %.

Замечаний нет.





## Капитальный ремонт Библиотека № 15

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Нахимовская д. 31  
Дата выезда 04.04.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*  
*Васильева Глория Васильевна*  
*Нагин Сергей Юрьевич*

#### Комментарии по объекту:

- Выполнены работы по стяжке пола
- Произведена подготовка стен под покраску
- Установлен каркас под обшивку труб гипсокартонном

На объекте в момент выезда находилось 4 рабочих.

Объем выполненных работ около 50 %.

Замечаний нет.





## Реконструкция трибун стадиона «Водник»

План социального развития центров экономического роста  
(Развитие физической культуры и спорта ПК)

г. Находка, ул. Владивостокская 56

Дата выезда 24.04.2024 г.

Белобородова Юлия Валентиновна

Карпетян Карен Камоевич

Леонова Юлия Викторовна

Нагин Сергей Юрьевич

Чигринская Наталья Викторовна

Яшкина Анна Анатольевна



### Комментарии по объекту:

- Ведутся работы по реконструкции трибун, трибуны 1 и 2 типа готовы
- Трибуны тип 3 (нижний ярус) – производятся подготовительные работы по армированию и бетонированию плит.
- Трибуна тип 4 – производится армирование трибун и лестниц
- Трибуна тип 5 – производится заливка бетоном плит
- Трибуна тип 6 – производится установка опалубки под бетонирование

На объекте в момент выезда находилось 16 рабочих, работы идут в соответствии с графиком.

Объем выполненных работ около 45%

Замечаний нет.





## Комплексное благоустройство Видовая площадка № 3

### Национальный проект Формирование современной городской среды

г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)

Дата выезда 19.04.2024 г.

*Яшкина Анна Анатольевна  
Васильева Глория Васильевна  
Карапетян Карен Камоевич  
Тен Маргарита Константиновна  
Леонова Юлия Викторовна*

#### Комментарии по объекту:

- Выполнено зонирование объекта,
- Произведена отсыпка песком и щебнем
- Произведен демонтаж старой брусчатки и бордюрного камня
- Производится укладка новой брусчатки и установка нового бордюрного камня

На объекте в момент выезда находилось 8 рабочих

Объем выполненных работ около 50%.

Замечаний нет.





## Комплексное благоустройство «Сквер в районе МЦК» 1 этап

Национальный проект Формирование современной городской среды

г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22)

Дата выезда 19.04.2024 г.

*Васильева Глория Васильевна*

*Яшкина Анна Анатольевна*

*Карапетян Карен Камоевич*

*Ракауская Максим Ромуальдасович*

*Бондаренко Александр Валерьевич*

*Тен Маргарита Константиновна*

*Нагин Сергей Юрьевич*

*Чигринская Наталья Викторовна*

*Леонова Юлия Викторовна*


### Комментарии по объекту:

- Производится демонтаж и устройство лотковой ливневой канализации

На объекте в момент выезда находилось 6 рабочих и 1 единица техники

Объем выполненных работ около 1%.

Замечаний нет.

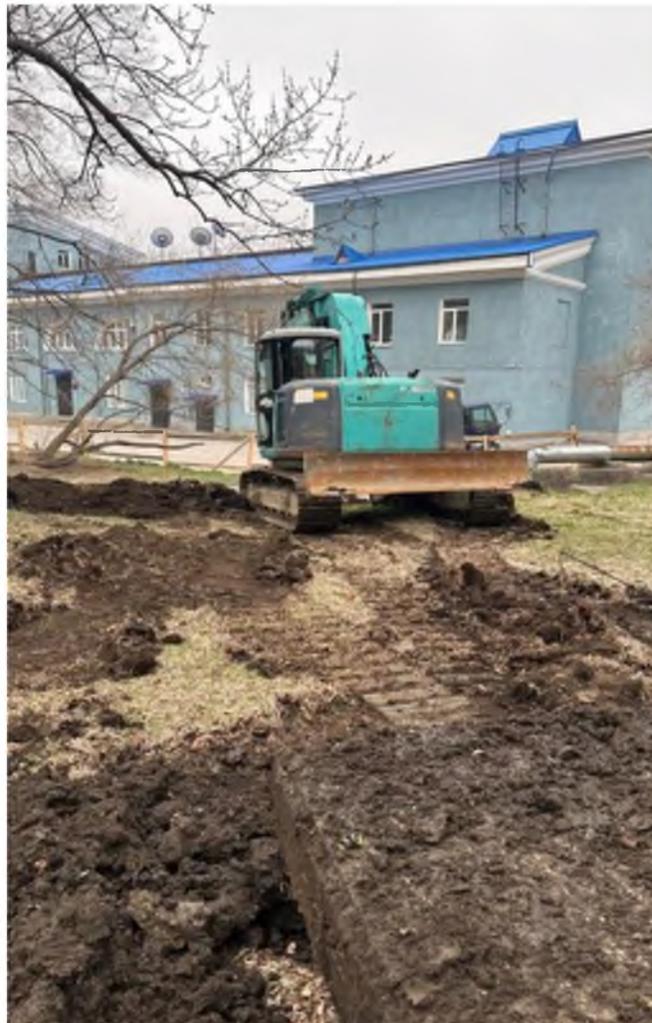



## МБДОУ № 33

### План социального развития центров экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Добролюбова, 7

Дата выезда **23.04.2024 г.**

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Леонова Юлия Викторовна*

*Чигринская Наталья Викторовна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт. Благоустройство территории

#### Комментарии по объекту:

- Ведутся земляные работы
- Произведена отсыпка основания щебнем в 1 слой
- Ведутся работы по установке бортового бордюрного камня
- Сделаны 2 бетонных основания для теневого навеса
- Производится отсыпка грунта под игровую и спортивную площадки
- При снятии грунта были обнаружены подводные воды, решается вопрос о переносе ливнеотоков

На объекте в момент выезда находилось 3 рабочих и 1 единица техники

Объем выполненных работ около 20%.

Замечаний нет.





## МБДОУ № 33

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Добролюбова, 7  
Дата выезда **23.04.2024 г.**

*Белобородова Юлия Валентиновна  
Леонова Юлия Викторовна  
Чигринская Наталья Викторовна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт помещений и  
санузлов здания

### Комментарии по объекту:

- Проведены демонтажные работы, устройство кирпичных перегородок, перемычек.
- В 3-х помещениях производится укладка настенной плитки,
- В 1 помещении ведутся работы по стяжке пола

На объекте в момент выезда находилось 4 рабочих

Объем выполненных работ около 25%.

Замечаний нет.





## МБДОУ № 37

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Ленинградская, 1а

Дата выезда 24.04.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Леонова Юлия Викторовна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт ливневой канализации и  
асфальта-бетонного покрытия


### Комментарии по объекту:

- Проезд на территорию огорожен стоп лентами
- Произведен демонтаж старого асфальта
- Выполнены земляные работы: замена грунта, отсыпка щебнем
- Сформирована откосная часть
- Установлены лотки ливнестока

На момент выезда был дождь, работы на объекте не производились

Объем выполненных работ около 30%.

Замечаний нет.

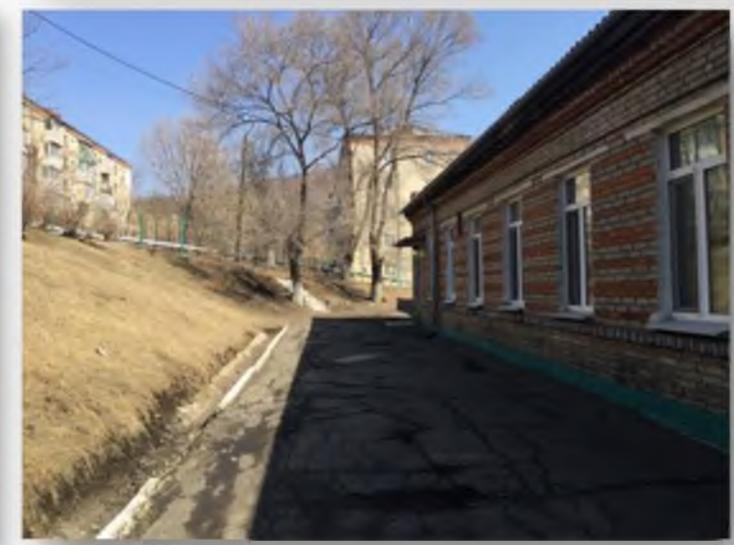



## МАОУ СОШ № 14

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, Проспект Мира, 24 б  
Дата выезда 24.04.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна  
Чигринская Наталья Викторовна  
Каранетян Карен Камоевич  
Нагин Сергей Юрьевич  
Белобородова Юлия Валентиновна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт спортивной площадки



### Комментарии по объекту:

- Произведена планировка местности, отсыпка песком и щебнем
- Устанавливается бордюр и лотки ливнестоков

На момент выезда из-за погодных условий работы на объекте не производились

Объем выполненных работ около 40%.

Замечаний нет.





## МАОУ СОШ № 22

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, Проспект Мира, 24 б

Дата выезда 24.04.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна*

*Белобородова Юлия Валентиновна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт. Благоустройство территории.  
Спортивная площадка

### Комментарии по объекту:

- Проезд на территорию огорожен стоп лентами.
- Производится отсыпка щебнем
- Формируется основание площадки
- Выполнен дренаж, установлены лотки ливнестока
- Демонтированы старые опоры освещения и забор

На момент выезда на объекте находилось 5 рабочих  
и 4 единицы техники

Объем выполненных работ около 40%.

Замечаний нет.



# Объекты в процессе работы АПРЕЛЬ 2024 г.



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
1	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка , ул. Арсеньева, д. 8	1%	Выполняются земельные работы, планировка территории вокруг дома. Присутствовали 2 рабочих, 1 ед. техники.	
2	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Заводская, 3	15%	Проводятся земельные работы. Отсыпка щебнем и укладка бордюрного камня	
3	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Малиновского, д.17	10%	Установлен бортовой камень, сделано щебеночное основание, засыпана щебнем бельевая площадка, готовы основания под ограждения зеленой зоны	
4	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Мичурина, 18	15%	Произведена отсыпка щебнем установлен бортовой бордюрный камень. Подготовлено бетонное основание для установки ограждения. Выложены пешеходные дорожки из железобетонных плит.	

# Объекты в процессе работы АПРЕЛЬ 2024 г.



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
5	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Нахимовская, д. 8А	10%	Установлены бортовой камень и опоры под освещение; частично засыпан щебень	
6	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Находкинский проспект, 30	0%	Работы не начаты, рабочие и техника отсутствуют	
7	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Находкинский проспект, 80	5%	Проводятся земляные работы. Идёт планировка территории вокруг дома	
8	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, 24	15%	Сделан демонтаж асфальтобетонного покрытия. Произведена засыпка щебнем основания, установлен бортовой бордюрный камень. Подготовлено бетонное основание для установки ограждения	



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
9	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, 30	10%	Произведена отсыпка щебнем, установлен бортовой тротуарный камень	
10	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Проспект Мира, д. 18	15%	Установлен бортовой камень, сделано щебеночное основание, залиты основания под ограждения зеленой зоны	
11	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Проспект Мира, д. 30Б	15%	Установлен бортовой камень, сделано щебеночное основание, залиты основания под ограждения зеленой зоны	
12	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Рыбацкая, 8	10%	Проводятся земляные работы. Отсыпка щебнем и укладка камня бордюрного. Идёт планировка территории вокруг дома	

# Объекты в процессе работы АПРЕЛЬ 2024 г.



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
13	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Восточный проспект, 9	0%	Работы еще не начались	
14	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Железодорожная, 2	0%	Работы еще не начались	
15	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Первостроителей, 1	3%	Производится земляные работы	
16	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Приморский проспект, 6	0%	Работы еще не начались	



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
17	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Ливадия, ул. Заречная, д.3	0%	Работы еще не начались	 
18	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	п. Ливадия, ул. Луговая, 26	0%	Работы еще не начались	
19	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 5	0%	Работы еще не начались	 
