

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

19 августа 2025 года

14:00 ч.

Председатель - глава администрации Находкинского городского округа
Т.В. Магинский

Присутствовали: 36 человека (Приложение №1).

1. О результатах мониторинга общественными наблюдателями выполненных работ на объектах, реализуемых в Находкинском городском округе по итогам выездов на 18.08.2025 года.

1.1 Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей на 18.08.2025 на объекты: создание модельной библиотеки в библиотечном комплексе «Семья» по ул. Арсеньева, 5; строительство поликлиники на ул. Тисовой; капитальный ремонт общежития НГГПК по Находкинскому проспекту, 44, по ул. Пирогова, 17 стр.2; капитальный ремонт учебного корпуса НГГПК по ул. Пирогова, 17; сквер «Панорамный»; капитальный ремонт Памятника Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.; обустройство туристского маршрута (тропы) Бухта «Прозрачная» - Бухта «Отрада» - Бухта «Козина»; строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. Общая протяженность 3.4 км.); создание образовательного комплекса МАОУ СОШ № 1 «Полюс» (планетарий для школьных занятий, IT-полигон); кит-символ Ливадии; благоустройство дворовых территории по адресам: г. Находка, ул. Тимирязева, 9, п.Ливадия, ул. Луговая, 15 и 27; текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году; МАОУ СОШ № 5 – Жить-Родине служить (полоса препятствий); МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка полоса препятствий; МАОУ СОШ №22 Сад Памяти Героев России; обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов в МАОУ СОШ № 7 Эдельвейс; современная площадка на территории детского сада № 60; Благоустройство территории детского сада № 35; музейный дворик; сквер в районе МЦК (Приложение № 2).

1.2 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Мителенко М.М. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 12.08.2025 на объект: текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году - на панелях левого пилона имеются следы ржавчины, на объекте отсутствует ограждение ограничивающее доступ к объекту жителей и гости города, отсутствует контроль за доступом и соблюдением мер безопасности.

1.3 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 13.08.2025 на объект: современная площадка на территории детского сада № 60 - скамейка для детей в беседке не отшлифована, поверхность дерева имеет шероховатости, деревянные и металлические поверхности беседки имеют не прокрашенные участки, краска легла не равномерно, полы беседки укреплены недостаточно, местами прогибаются при ходьбе.

1.4 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Гурдина М.П. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 13.08.2025 на объект: благоустройство территории детского сада № 35 - на карусели сбита краска, проявляется ржавчина, подпорная стена за беседкой не засыпана грунтом, скамеечная доска в беседке не шлифована, калитка при открывании бьётся об бетонную подпорную стену, металлоконструкция беседки имеет множественные очаги ржавчины, на окрашенном ограждении появляется ржавчина, ливневка забита песком.

1.5 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Горщик В.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 13.08.2025 на объект: музейный дворик - одна подпорная стена без водоотвода, уровень по всей подпорной стене имеет разную высоту, декоративные элементы на бетонированной стене нанесены неравномерно, выглядит неэстетично, в подпорной стене часть сливных труб забиты цементом, паспорт объекта и оградительная ленты отсутствуют.

1.6 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Горщик В.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 11.08.2025 на объект: сквер в районе МЦК - в нескольких местах на брусчатке имеются зазоры.

1.7 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 принять меры по устранению замечаний **в срок до 25.08.2025.**

1.8 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Назарук Е.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 15.08.2025 на объект: МАОУ СОШ № 5 – Жить-Родине служить (полоса препятствий) и МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка, полоса препятствий – малые архитектурные формы изготовлены не в полном объеме.

1.9 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Горщик В.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 18.08.2025 на объект: МАОУ СОШ №22 Сад Памяти Героев России, обустройство пришкольной территории – на ограждении имеется ржавчина, на клумбе нет заявленной травы, имеются трещины бетонных оснований под табличками, с металлических оснований сходит краска, имеются оголенные бетонные основания не засыпанные гравием, стыки на бордюрном камне имеют зазор, фотографии Героев отсутствуют.

1.10 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Назарук Е.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 18.08.2025 на объект: у подрядчика, возникли сложности с закупкой малых архитектурных форм для игрового пространства «Веселый остров» и светофора для авто городка.

1.11 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.) и директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.8, 1.9, 1.10, принять меры по устранению замечаний **в срок до 25.08.2025.**

1.12 Заместителям главы администрации Находкинского городского округа, курирующим реализацию объектов на территории Находкинского городского округа в соответствии с утвержденным Перечнем и руководителям ответственных отраслевых территориальных (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа организовать работу по взаимодействию с общественными наблюдателями Находкинского городского округа:

1.12.1 в части организации выезда на объекты мониторинга:

- обеспечить присутствие ответственного сотрудника от отраслевого территориального (функционального) органа администрации Находкинского городского округа, в случае его отсутствия обеспечить замену;
- обеспечить присутствие представителя подрядной организации, выполняющей работы;
- обеспечить присутствие представителя от учреждения на территории которого выполняются работы;
- обеспечивать присутствие организаторов проектов инициативного бюджетирования «Твой проект» и «Молодежный бюджет»;
- обеспечить наличие проектной документация (схем, планов, визуализации).

1.12.2 в части устранения замечаний и рассмотрения предложений:

- ответственным сотрудникам отраслевых территориальных (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа, выезжающим на объекты, организовать оперативную передачу сведений о результатах выездной проверки с общественными наблюдателями курирующим объект руководителям.

1.12.3 в части соблюдения требований безопасности на объектах мониторинга:

- организовать работу с подрядными организациями по технике безопасности нахождения общественных наблюдателей на объектах с прохождением соответствующих инструктажей.

2. О ходе исполнения контрактов по мероприятиям, реализуемым в 2025 году, в рамках национальных проектов, планов социального развития центров экономического роста и государственных программ Приморского края в соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа от 05.03.2025 №194-р.

2.1 Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. об обеспечении исполнения по мероприятиям, реализуемым в 2025 году, в рамках национальных проектов, планов социального развития центров экономического роста и государственных программ Приморского края на 18.08.2025 года.

2.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить:

- соблюдение сроков исполнения контрактов по мероприятиям, реализуемым в 2025 году;

- своевременную подачу заявок в отраслевые органы Приморского края на получение средств для расчетов с подрядчиками;

- усилить контроль за соблюдением сроков оплаты по муниципальным контрактам.

2.3 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.) усилить контроль и обеспечить качественную, и своевременную подготовку документов по реализации проектов инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» для направления заявок в министерство финансов Приморского края.

2.4 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Шевченко А.В.), заместителю начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Григорьева Т.А.) обеспечить своевременную реализацию мероприятия долгосрочного плана комплексного социального – экономического развития Находкинского городского округа Приморского края: Капитальный ремонт фасадов (Находкинский пр-т, 98, г. Находка, Находкинский пр-т, 110).

В срок до 27.08.2025:

- организовать рабочее совещание с участием представителей профильных министерств и КГАУ «Примгосэкспертиза»;

- предоставить информацию о текущей ситуации в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа Петрошенко К.А.

2.5 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Браташ Д.М.), директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) обеспечить своевременную реализацию мероприятия долгосрочного плана комплексного социального – экономического развития Находкинского городского округа Приморского края: Строительство ПС 110/6 "Перевал" с заходами в г. Находка в районе ул. Перевальная.

В срок до 27.08.2025:

- организовать рабочее совещание с участием представителей ООО «ДРСК» и представителей профильных министерств;

- подготовить письма в профильные министерства о нарушении со стороны подрядной организации ООО «ДРСК» сроков реализации мероприятия;

- подготовить претензионное письмо в ООО «ДРСК»;

- предоставить информацию о текущей ситуации в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа Петрошенко К.А.

2.7 Директору МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой К.Е.), взять на особый контроль реализацию мероприятия: Благоустройство дворовых территории (ул. Тимирязева,9; ул. Луговая,15; ул. Луговая, 27) с учетом срока реализации 31.08.2025, обеспечить еженедельный мониторинг ситуации по поставке малых архитектурных форм.

3. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов на 15.08.2025 года.

3.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Мягких Е.С. об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов на 15.08.2025 года (Приложение № 4).

3.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

Глава Находкинского городского округа

Т.В. Магинский

Секретарь

А.А. Журавлева

СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

19.08.2025

14:00

1. **МАГИНСКИЙ**
Тимур Владимирович - глава находкинского городского округа, председатель Проектного комитета;
2. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя Проектного комитета;
3. **ЖУРАВЛЕВА**
Альбина Андреевна - главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа, секретарь Проектного комитета.

Члены Проектного комитета:

4. **ВАЛЕВИЧ**
Вера Николаевна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
5. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;
6. **ПОДГОРНЫЙ**
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
7. **КУЗНЕЦОВ**
Андрей Владимирович - председатель Думы Находкинского городского округа;
8. **СЕРГАНОВ**
Олег Львович - заместитель председателя Думы Находкинского городского округа;
9. **МИЛЬЧЕНКО**
Александр Иванович - депутат Думы Находкинского городского округа;
10. **ЕВСТРАТОВ**
Владимир Николаевич - депутат Думы Находкинского городского округа;
11. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа;

12. **БУРЛАКОВА**
Ольга Николаевна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа;
13. **ГРИГОРЬЕВА**
Татьяна Александровна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
14. **ЖУРАВЛЕВА**
Анжелика Ивановна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
15. **ЗУБКОВА**
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
16. **КАЛИЕВСКАЯ**
Наталья Геннадьевна - начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа;
17. **ЛЁЛИН**
Игорь Валерьевич - директор МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа»;
18. **МЯГКИХ**
Елена Сергеевна - заместитель начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа;
19. **ПЕТРОШЕНКО**
Кристина Алексеевна - начальник управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
20. **ПОПОВА**
Александра Игоревна - заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»;
21. **РОЙ**
Константин Евгеньевич - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
22. **РУДНИЦКАЯ**
Светлана Ивановна - заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
23. **СЕДОВА**
Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственно-технический отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление Городским Хозяйством»;
24. **СОМОВА**
Мария Викторовна - начальник правового управления администрации Находкинского городского округа;

СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

19.08.2025

14:00

1. **МАГИНСКИЙ**
Тимур Владимирович - глава находкинского городского округа, председатель Проектного комитета;
2. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя Проектного комитета;
3. **ЖУРАВЛЕВА**
Альбина Андреевна - главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа, секретарь Проектного комитета.

Члены Проектного комитета:

4. **ВАЛЕВИЧ**
Вера Николаевна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
5. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;
6. **ПОДГОРНЫЙ**
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
7. **КУЗНЕЦОВ**
Андрей Владимирович - председатель Думы Находкинского городского округа;
8. **СЕРГАНОВ**
Олег Львович - заместитель председателя Думы Находкинского городского округа;
9. **МИЛЬЧЕНКО**
Александр Иванович - депутат Думы Находкинского городского округа;
10. **ЕВСТРАТОВ**
Владимир Николаевич - депутат Думы Находкинского городского округа;
11. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа;

- | | | |
|-----|--|---|
| 25. | УСТИНОВ
Алексей Иванович | - директор МКУ «Управление капитального строительства»; |
| 26. | УСТИНОВА
Ольга Валентиновна | - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации; |
| 27. | ХОЛОДОВСКАЯ
Ольга Сергеевна | - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа; |
| 28. | БЕЛОБОРОДОВА
Юлия Валентиновна | - общественный наблюдатель; |
| 29. | БОНДАРЕНКО
Александр Валерьевич | - общественный наблюдатель; |
| 30. | ПОЛИКАРПОВА
Глория Васильевна | - общественный наблюдатель; |
| 31. | ГОРЩИК
Вероника
Александровна | - общественный наблюдатель; |
| 32. | МИТЕЛЕНКО
Михаил Михайлович | - общественный наблюдатель; |
| 33. | НАЗРУК
Екатерина Андреевна | - общественный наблюдатель; |
| 34. | НИКИТИН
Денис Витальевич | - общественный наблюдатель; |
| 35. | ТЕН
Маргарита
Константиновна | - общественный наблюдатель; |
| 36. | ЧИГРИНСКАЯ
Наталья Викторовна | общественный наблюдатель. |

- | | | |
|-----|--|---|
| 25. | УСТИНОВ
Алексей Иванович | - директор МКУ «Управление капитального строительства»; |
| 26. | УСТИНОВА
Ольга Валентиновна | - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации; |
| 27. | ХОЛОДОВСКАЯ
Ольга Сергеевна | - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа; |
| 28. | БЕЛОБОРОДОВА
Юлия Валентиновна | - общественный наблюдатель; |
| 29. | БОНДАРЕНКО
Александр Валерьевич | - общественный наблюдатель; |
| 30. | ПОЛИКАРПОВА
Глория Васильевна | - общественный наблюдатель; |
| 31. | ГОРЩИК
Вероника
Александровна | - общественный наблюдатель; |
| 32. | МИТЕЛЕНКО
Михаил Михайлович | - общественный наблюдатель; |
| 33. | НАЗРУК
Екатерина Андреевна | - общественный наблюдатель; |
| 34. | НИКИТИН
Денис Витальевич | - общественный наблюдатель; |
| 35. | ТЕН
Маргарита
Константиновна | - общественный наблюдатель; |
| 36. | ЧИГРИНСКАЯ
Наталья Викторовна | общественный наблюдатель. |




ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА





В июле общественными
наблюдателями проведено
24 выезда





В ТОП лидеров по количеству выездов вошли:



Июль:

1. Горщик В.А – 18 выездов
2. Никитин Д.В. – 16 выездов
3. Чигринская Н.В. – 12 выездов



**РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов
по итогам выездов
на 18.08 2025**

Объекты без замечаний




Создание модельной библиотеки – в библиотечном комплексе «Семья»

Национальный проект «Семья»

г. Находка, ул. Арсеньева, 5

Дата выезда 08.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%

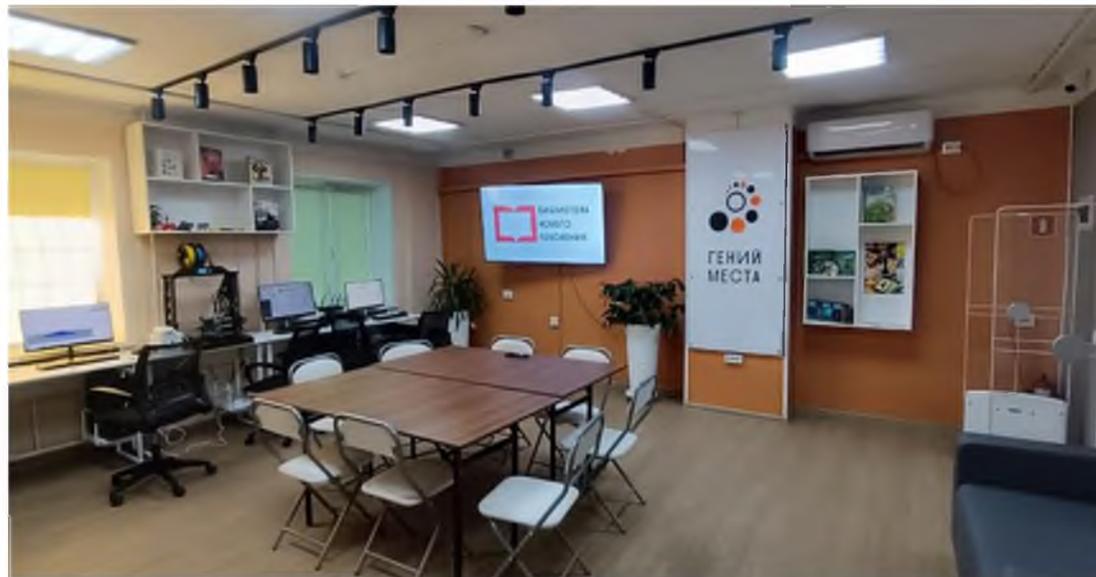

Объекты без замечаний



Создание мастерской по компетенции «Пожарная безопасность» в МУОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

ГП - развитие образования ПК

г. Находка, ул. Кирова, 13

Дата выезда 15.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



МАОУ СОШ № 8 Школьный дворик

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Садовая, 1

Дата выезда 15.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



Строительство поликлиники КГБУЗ «Находкинская городская больница»

Национальный проект «Здравоохранение»

г. Находка, ул. Тиссовая

Дата выезда 23.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 73% (скорректированы объёмы работ в результате перепланировки)



Объекты без замечаний



Капитальный ремонт здания общежития КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

г. Находка, ул. Находкинский проспект, д. 44

Дата выезда 25.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 62%



Объекты без замечаний




Капитальный ремонт здания общежития КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

г. Находка, ул. Пирогова, д. 17, стр. 2

Дата выезда 25.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 85%

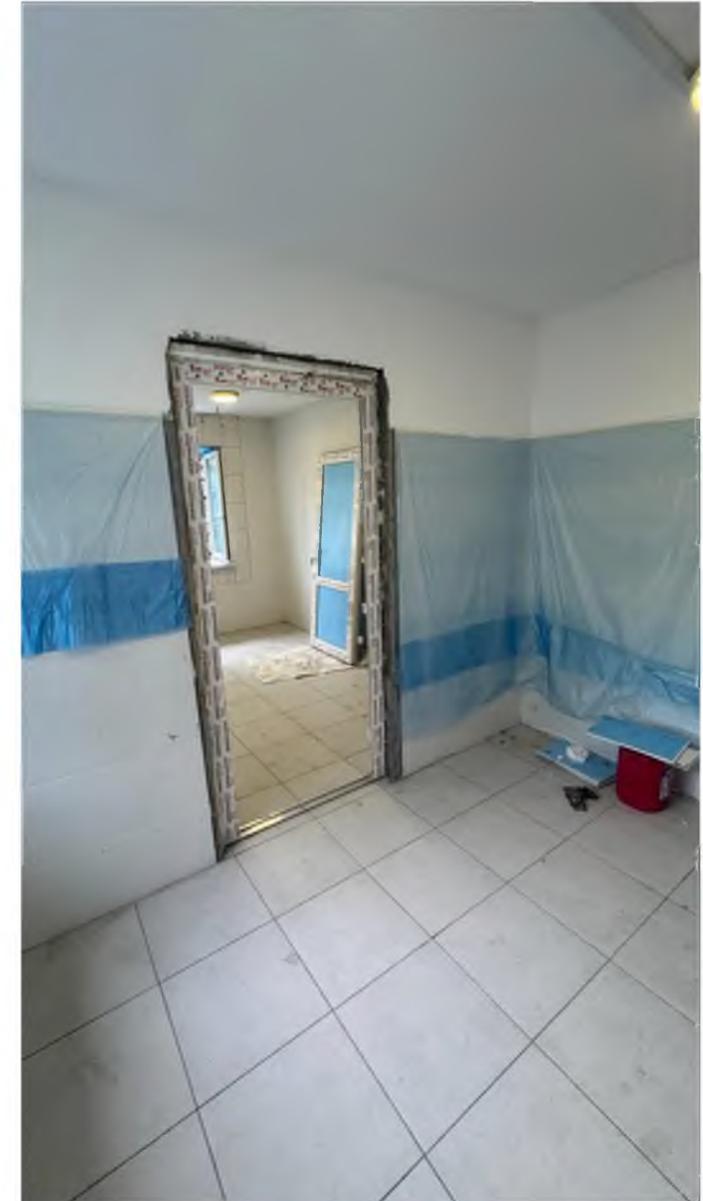

Объекты без замечаний



Капитальный ремонт здания учебного корпуса КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

г. Находка, ул. Пирогова, д. 17

Дата выезда 25.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 72%



Объекты без замечаний



Сквер «Панорамный»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Дата выезда 12.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 50%



Объекты без замечаний



Капитальный ремонт Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Развитие культуры ПК

Дата выезда 25.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 15%



Объекты без замечаний





Обустройство туристского маршрута (тропа осьминога) Бухта «Прозрачная» - Бухта «Отрада» - Бухта "Козина"

План социального развития центров экономического роста

Дата выезда 15.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 12%

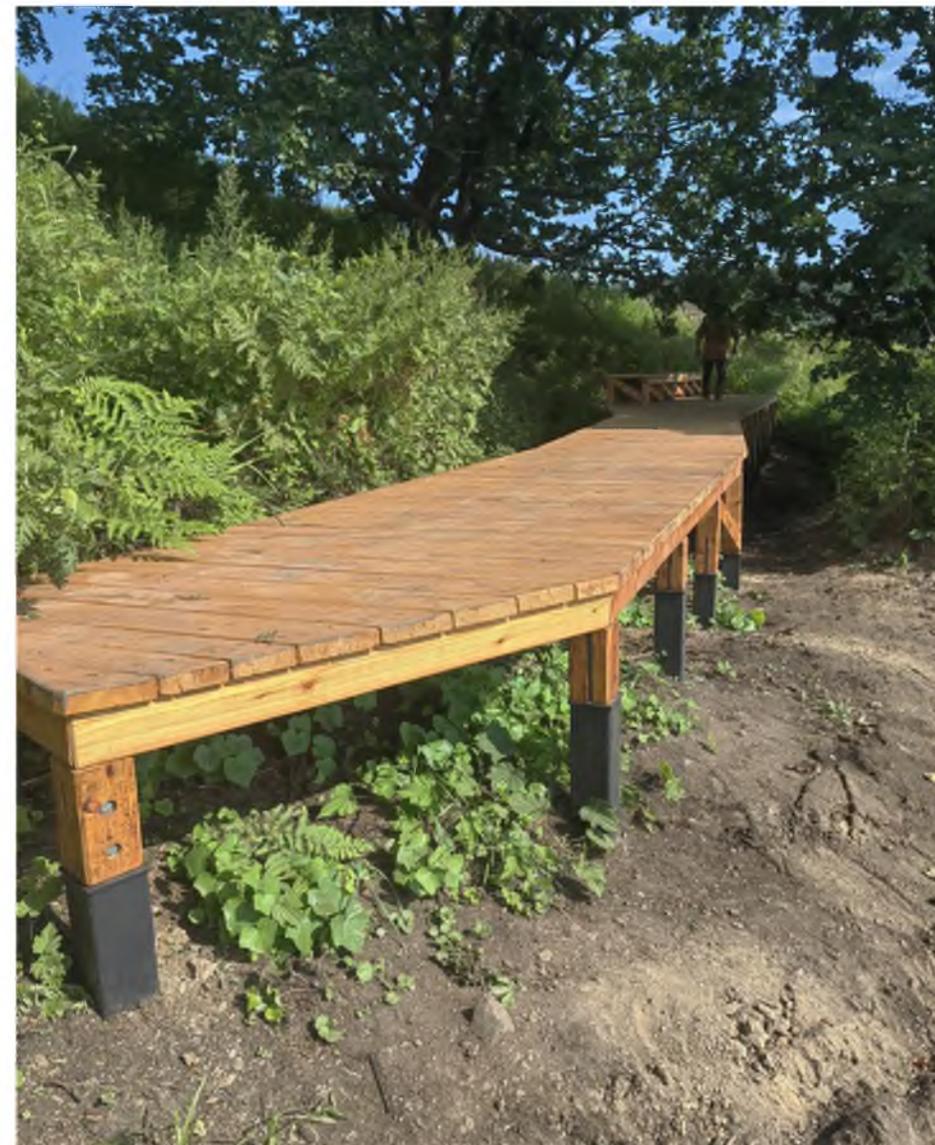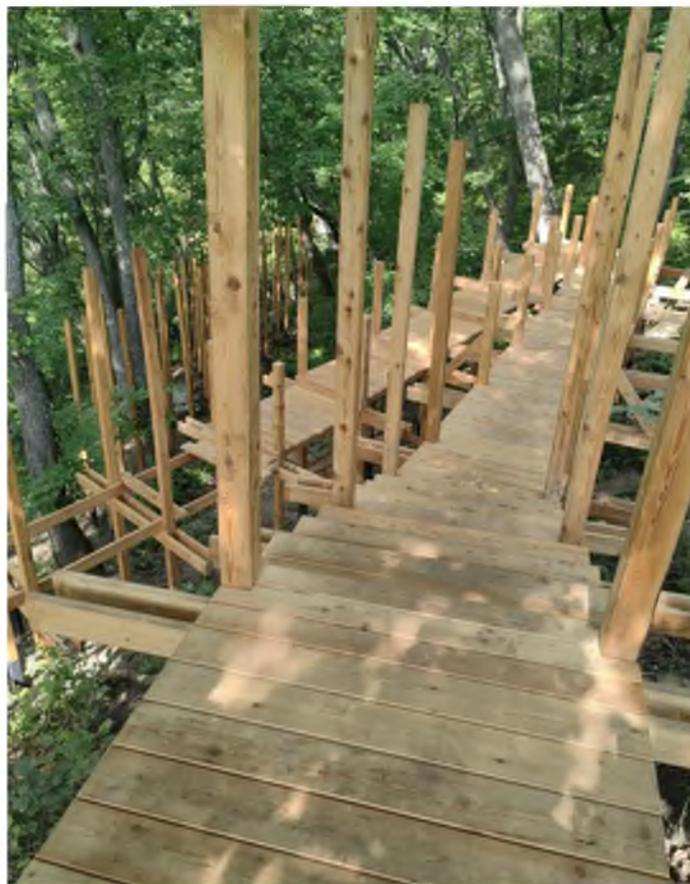



Объекты без замечаний

Строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. Общая протяженность 3.4 км.)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка

Дата выезда 21.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 20%



Объекты без замечаний



Создание образовательного комплекса МАОУ СОШ № 1 «Полюс» (планетарий для школьных занятий, IT-полигон)

ГП - развитие образования ПК

г. Находка, ул. Астафьева, д.123

Дата выезда 15.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 45%





Кит-символ Ливадии

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

ориентир: ул. Заречная, 2, мкр. п. Ливадия, г. Находка, Приморский кр.

Дата выезда 23.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 85%



Объекты без замечаний



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

п. Ливадия, ул. Луговая, 15

Дата выезда 06.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 25%



Объекты без замечаний



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

п. Ливадия, ул. Луговая, 27

Дата выезда 06.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 15%



Объекты без замечаний



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

ул. Тимирязева, 9

Дата выезда 29.07.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 77%



Объекты без замечаний



Текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море, 1979г.

Развитие культуры ПК

расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка,
в 110 м на юго-востоке от жилого дома по пер.
Гоголевский, 8

Дата выезда 12.08.2025 г.


Общий объем выполненных работ: 65%



Объекты с замечаниями



Текущий ремонт «Памятник членам экипажа
СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море, 1979г.

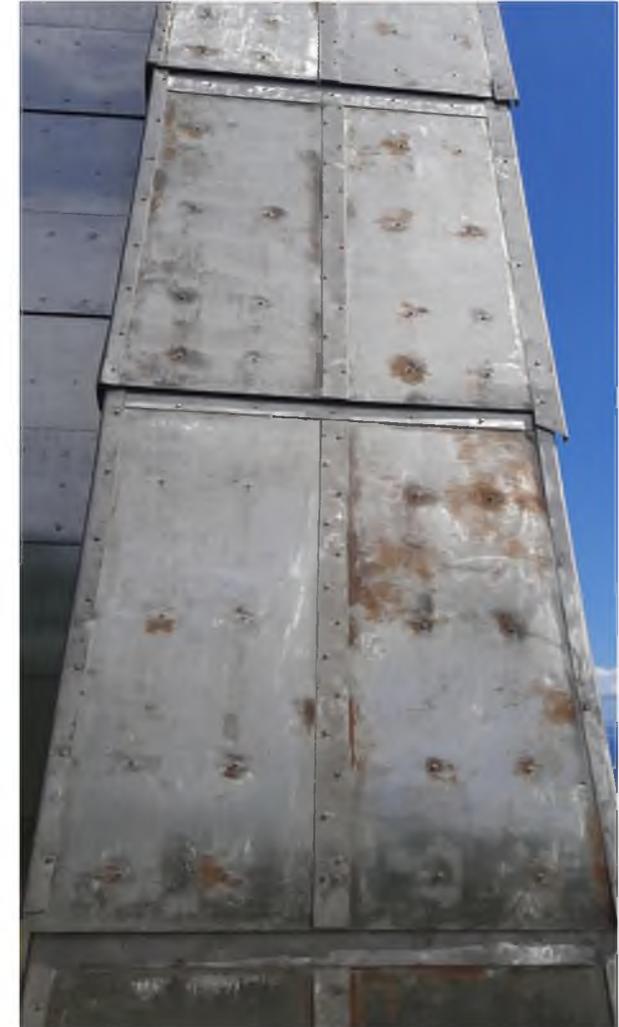



МАОУ СОШ № 5 Жить-Родине служить

Инициативное бюджетирование
«Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Малиновского, 25

Дата выезда 15.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 10%





МАОУ СОШ № 25

Школьная площадка. Полоса препятствий

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Бокситогорская, 20

Дата выезда 18.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 20%



Объекты с замечаниями



МАОУ СОШ №22 Сад Памяти Героев России

Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"

г. Находка, ул. Юбилейная, 12,

Дата выезда 18.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 99%



Объекты с замечаниями



Обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов в МУОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Кирова, 13

Дата выезда 18.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 60%



Объекты с замечаниями





Современная площадка на территории детского сада № 60

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

г. Находка, ул. Кирова, 13

Дата выезда 13.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 95%

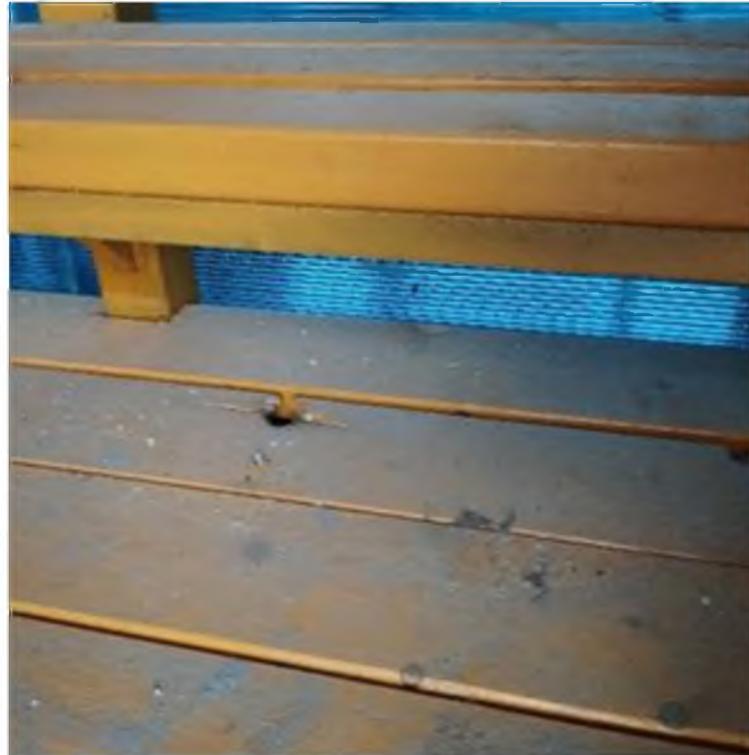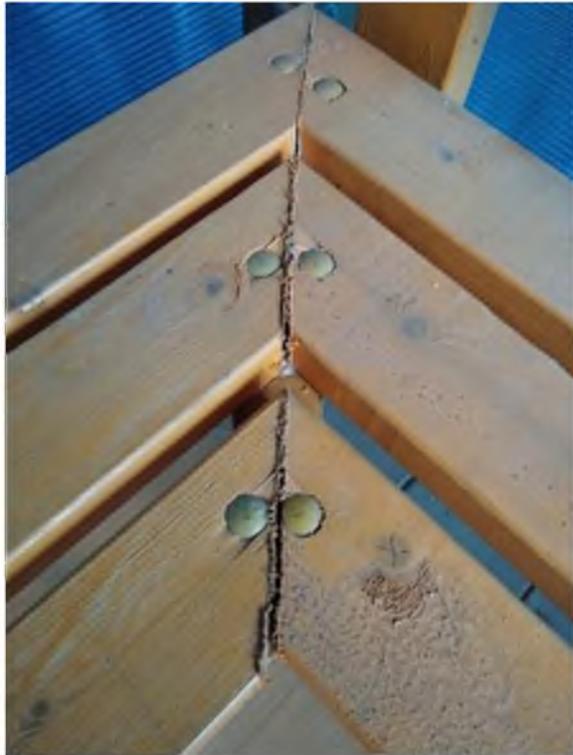

Объекты с замечаниями




Благоустройство территории детского сада № 35

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

г. Находка, ул. Гончарова, 8А

Дата выезда 13.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 95%

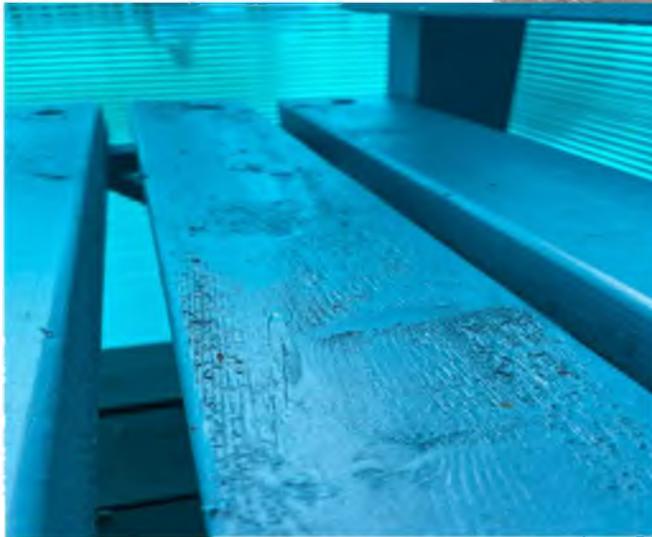

Объекты с замечаниями




Музейный дворик

Инициативное бюджетирование
«Твой проект»

ул. Владивостокская, дб, г. Находка

Дата выезда 13.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 40%

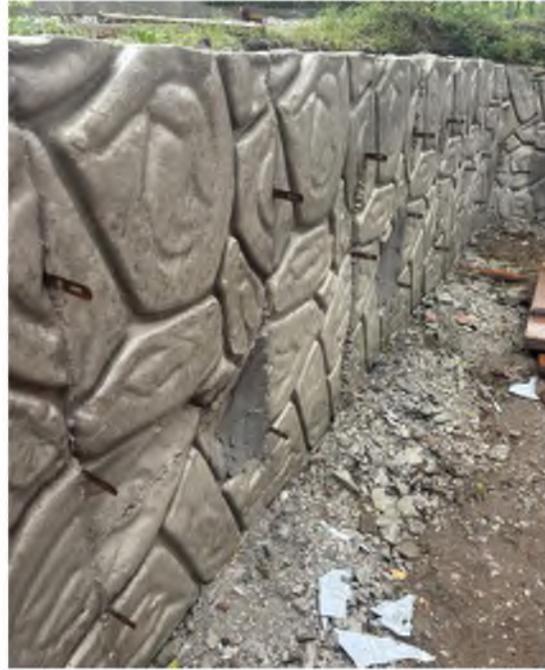



Сквер в районе МЦК

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

(Приморский край,
г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22))

Дата выезда 11.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 50%

